高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)



YCO1標


土建及設施機電 統包工程

> YC01標施工前說明會 113年12月12日



YGO1標

簡報大綱





工程團隊及工程範圍

高雄黃線YC01標工程團隊

「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)YC01標土建及設施機電統包工程」


機關:高雄市政府捷運工程局 🎢 高雄市政府捷運工程局



統包商:馬來西亞商金務大工程股份有限公司 GAMUDA

細設廠商(專業分包商):中興工程顧問股份有限公司 5 P 與工程顧問服份有限公司 5 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.

高雄黃線YC01標工程範圍

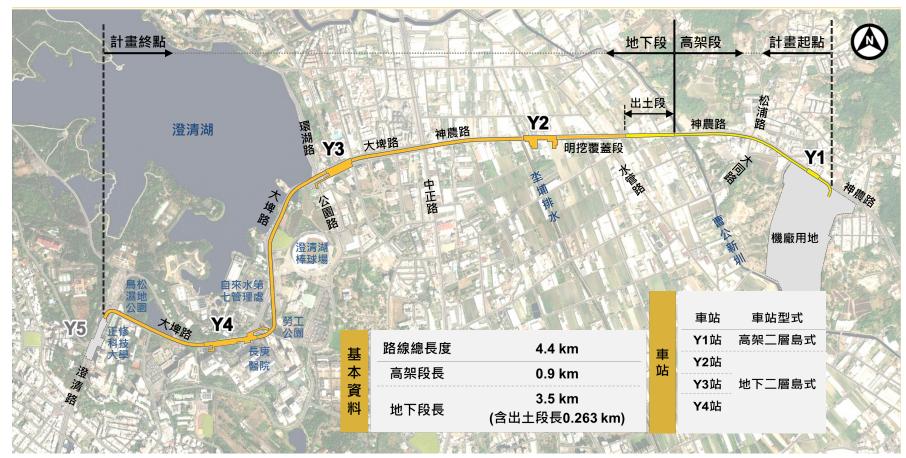

2

工程概述

高雄黃線YC01標工程概述及各區分段介紹



車站位置

高雄黃線YC01標車站位置 - Y1車站及高架段









初期高雄黃線YC01標工程範圍



<u>Y4站預計於114年02月中旬動</u> <u>工</u>

- 0-1階段 含路樹移植,人 行道削減,地上既有管線設 施遷移(分7次,共49天)
- 0-2階段 含路樹移植,地 上既有管線設施遷移(分7次; 共49天)
- 0-3階段 含路樹移植,人 行道削減,地上既有管線設 施遷移(分3次,共22天)

Y3站預計於114年02月中旬動工

- 0-1階段 路樹移植,人行道削減,地 上既有管線設施遷移(分6次,共42天)
- 0-2階段 路樹移植,人行道削減,地上既有管線設施遷移(分6次,共42天)
- 0-3階段 路樹移植,分隔島削減,地上既有管線設施遷移(分2次,共14天)
- 0-4階段 路樹移植,分隔島削減,地 上既有管線設施遷移(分2次,共14天)
- 0-5階段 路樹移植,分隔島削減,地 上既有管線設施遷移(分5次,共35天)

Y2站預計於113年12月下旬動工


- 0-1階段 路樹移植,道路 拓寬,地上既有管線設施遷 移(分7次,共49天)
- 0-2階段 路樹移植,分隔 島削減,地上既有管線設施 遷移(分7次,共49天)
- 0-3階段 路樹移植,道路 拓寬,地上既有管線設施遷 移(分3次,共21天)


Y1站預計於113年12月下旬動工


- 0-1階段 路樹移植,人行道 削減,地上既有管線設施遷移 (分7次,共49天)
- 0-2階段 路樹移植,分隔島 削減,地上既有管線設施遷移 (分7次,共49天)
- 0-3階段 路樹移植,人行道 削減,地上既有管線設施遷移 (分3次,共22天)

4

Y1車站初期作業工序

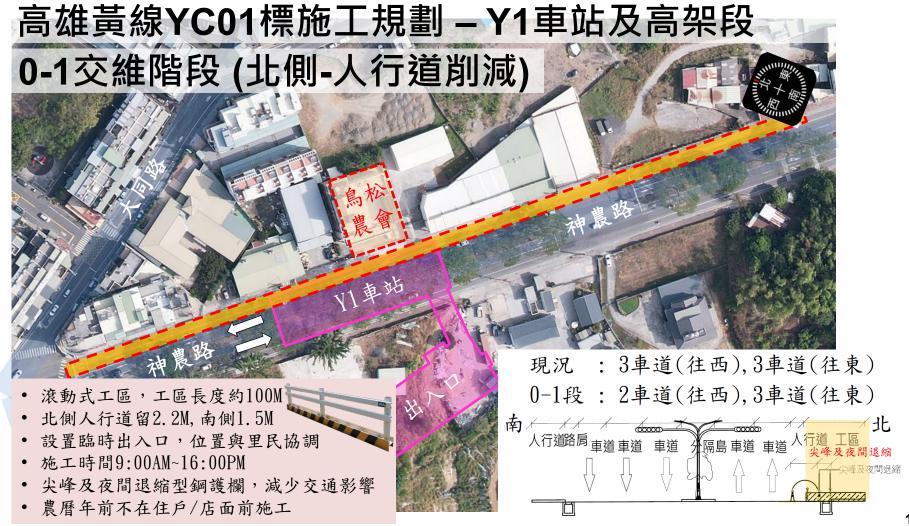


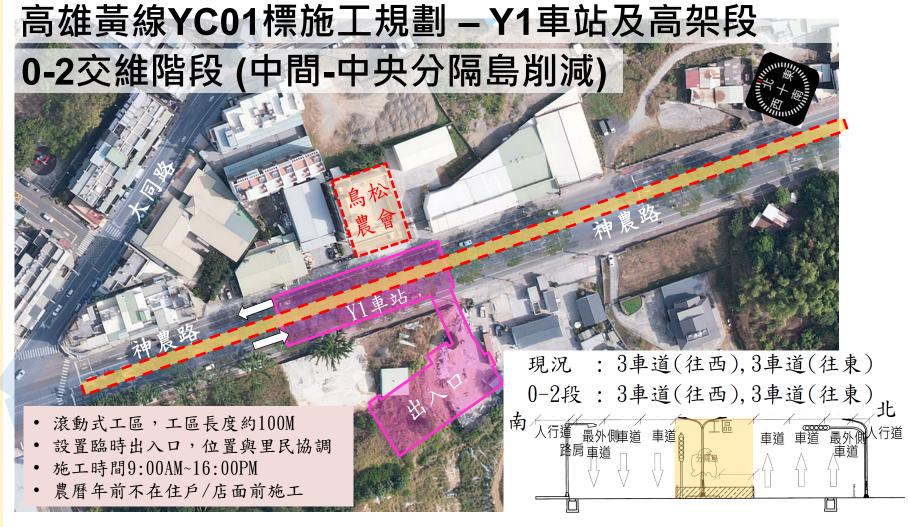

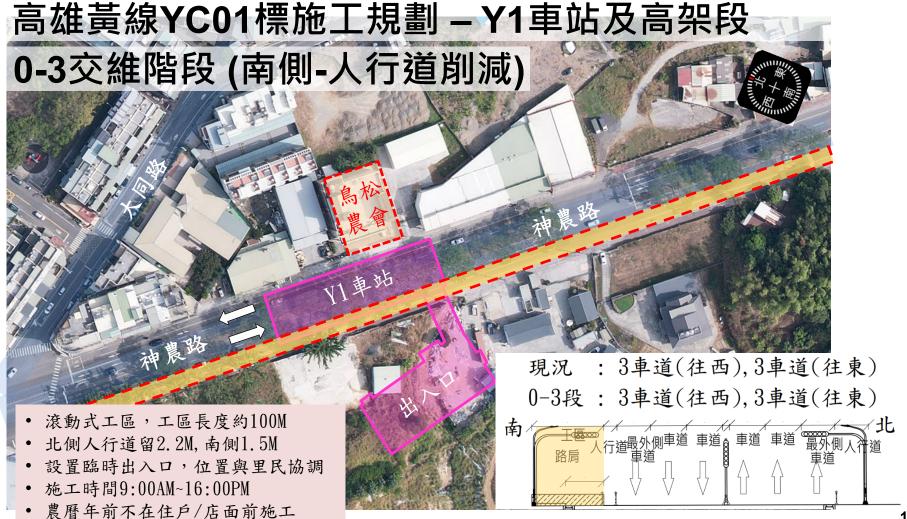

5


Y2車站初期作業工序

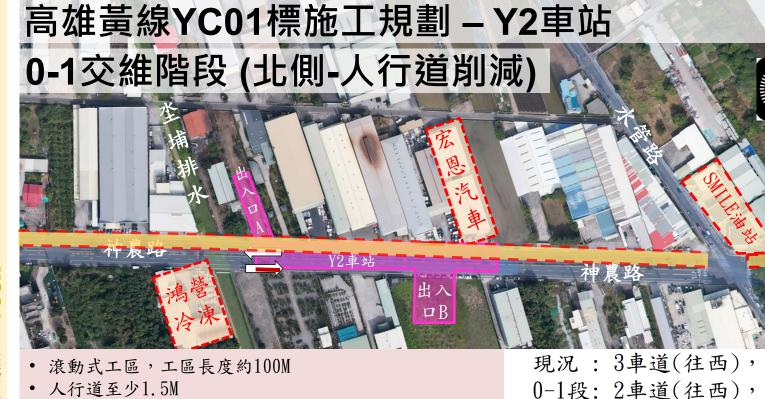


- 道路左右側個拓寬2.5M,保持原有車道數
- 設置臨時出入口,位置與里民協調
- 施工時間9:00AM~16:00PM
- 尖峰及夜間退縮型鋼護欄,減少交通影響
- 農曆年前不在住戶/店面前施工

現況: 3車道(往西),3車道(往東)

0-1段: 2車道(往西), 3車道(往東)



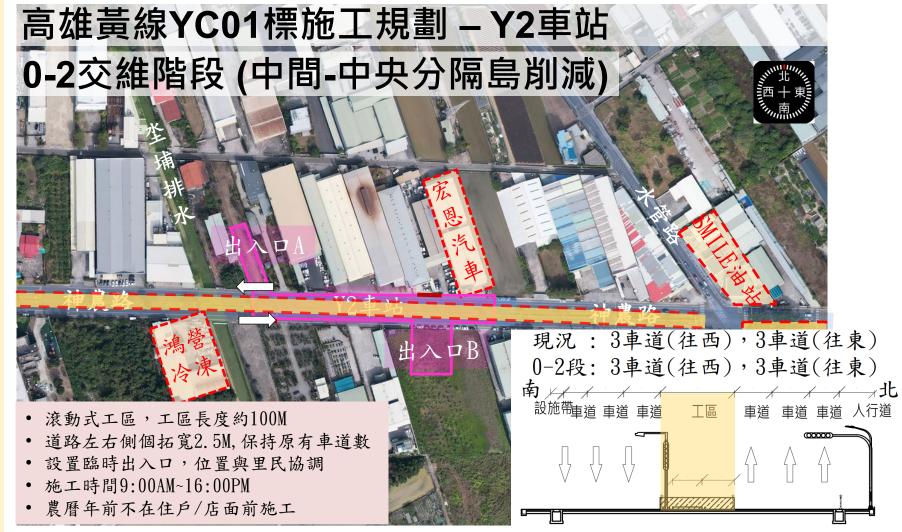



6

Y3車站初期作業工序




- 人行道至少1.5M
- 設置臨時出入口,位置與里民協調
- 施工時間9:00AM~16:00PM
- 農曆年前不在住戶/店面前施工



- 滾動式工區,工區長度約100M
- 人行道至少1.5M
- 設置臨時出入口,位置與里民協調
- 施工時間9:00AM~16:00PM
- 農曆年前不在住戶/店面前施工

0-2段: 3車道(往西),3車道(往東)





,滾動式工區,工區長度約100M

- 人行道至少1.5M
- 設置臨時出入口,位置與里民協調
- 施工時間9:00AM~16:00PM
- 農曆年前不在住戶/店面前施工





南

- ,滾動式工區,工區長度約100M
- 人行道至少1.5M
- 設置臨時出入口,位置與里民協調
- 施工時間9:00AM~16:00PM
- 農曆年前不在住戶/店面前施工

0-4段: 3車道(往西), 3車道(往東)



南

- · 滾動式工區,工區長度約100M
- 人行道至少1.5M
- 設置臨時出入口,位置與里民協調
- 施工時間9:00AM~16:00PM
- 農曆年前不在住戶/店面前施工

現況: 3車道(往西),3車道(往東)

0-5段: 3車道(往西),3車道(往東)







Y4車站初期作業工序

YC01

正建及设施幾毫充到正呈局雄都會區大眾捷運系統都

7001標

1建分分布幾雹充引12号高雄都會區大眾捷運系統都

里民意見彙整說明

店(住)戶訪視辦理情形

Y1站 店家與住家訪問調查表

拜訪店家、住家	接受訪談、提供意見	訪談後表示支持	拜訪無人回應
68	40	40	28

Y2站 店家與住家訪問調查表

拜訪店家、住家	接受訪談、提供意見	訪談後表示支持	拜訪無人回應
67	53	53	14

Y3站 店家與住家訪問調查表

拜訪店家、住家	接受訪談、提供意見	訪談後表示支持	拜訪無人回應
29	15	15	14

Y4站 店家與住家訪問調查表

拜訪店家、住家	接受訪談、提供意見	訪談後表示支持	拜訪無人回應
1	1	1	0

相關意見彙整說明

▶ Y1、Y2、Y3及Y4車站主要住(店)家意見內容:

Q1:施工時,門前留進出口。

A1:施工時於門前進出口處舖設鐵板,以利民眾出入。

Q2: 拓寬路段/削減人行道,斜坡道接順,跟住家地坪高低處理好。

A2:本案拓寬路段之順接斜坡道,會調整斜坡。

Q3:施工期間,注意揚塵抑制/夜間照明/噪音問題。

A3: 揚塵抑制施工期間,定期灑水降低揚塵。會確保夜間照明充足及遵守 噪音管理規定,夜間禁止高噪音施工。若施工工期緊急需在夜間作業,會 提前通知周邊居民和相關單位。

相關意見彙整說明

▶ Y1、 Y2、Y3及Y4車站主要住(店)家意見內容:

Q4:人行道削減退縮之兩遮及招牌要協助拆除及復原。

A4: 屆時協助雨遮、招牌之拆除及復原。

Q5:尚施工期間有影響水電,應盡力處理,以免影響產能。


A5: 會提前通知受影響的住戶。

Q6:住戶先行埋設排水及糞管至排水溝,日後拓寬施工須注意。


A6: 拓寬施工前,會再與住戶先行確認及協調。

✔☐☐☐ 標 高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)

民眾進出之解決辦法 - 平面圖

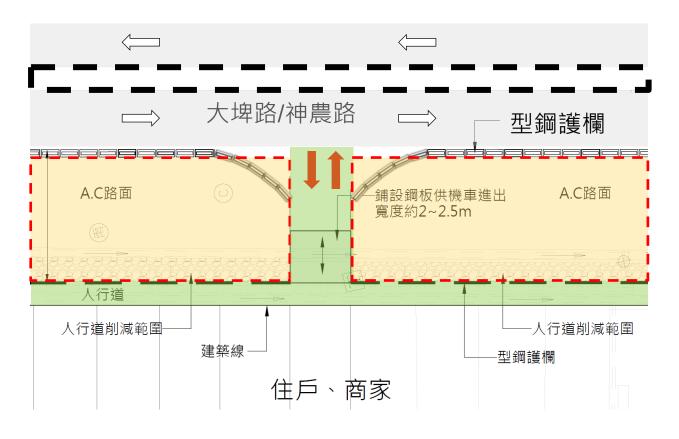

民眾進出之解決辦法 – 剖面圖

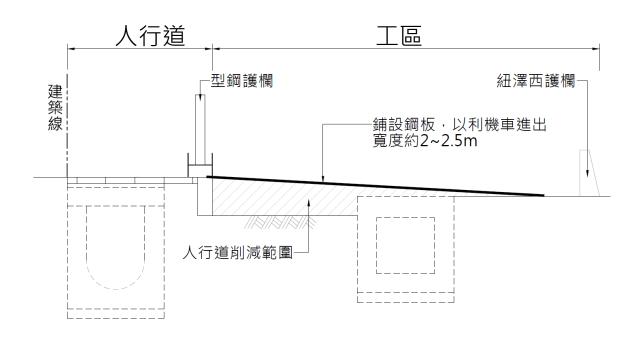



訪談照片









YC01施工團隊聯絡方式

- ◆ 施工中各項問題,請洽施工處協助,以利第一時間排除疑慮或親臨說明。
 - 馬來西亞商金務大工程股份有限公司/世久營造探勘工程股份有限公司
- ▶ 臨時辦公室地址:
 - 高雄市鳥松區大埤路17之1號
 - 連絡電話:07-3308038
 - 聯絡信箱:YC01_DC@gamuda.com.tw

單位	聯絡窗口	姓名	聯絡電話
台灣世曦工程顧問股份有 限公司	監造	王玉璋	0920-681-463
	監造	吳政璋	0933-394-140
馬來西亞商金務大工程股 份有限公司世久營造探勘 工程股份有限公司	工地主任	莊憲宗	0932-277-552
	Y1 站長	陳源松	0939-351-551
	Y2 站長	許錦正	0935-358-593
	Y3 站長	吳誠証	0912-519-882
	Y4 站長	陳凱明	0979-291-090

簡報結束 敬請指教



馬來西亞商金務大工程股份有限公司

₩世久營造探勘工程股份有限公司
